

LV Network - Task #272

Triển khai cặp switch N5K site FPT_HN

04-12-2023 14:43 - pham vu

Trạng thái:	Closed	Bắt đầu:	04-12-2023
Mức ưu tiên:	Normal	Hết hạn:	09-12-2023
Phân công cho:	pham vu	Tiến độ:	100%
Chủ đề:		Thời gian ước lượng:	0:00 giờ
Phiên bản:		Thời gian:	0:00 giờ
Mô tả			
Mục Tiêu: Triển khai thêm cặp N5K và dần dần chuyển các server qua cặp switch mới rút cặp củ về.			

Lược sử


#1 - 07-12-2023 13:59 - pham vu

- Tiến độ thay đổi từ 0 tới 30

#2 - 07-12-2023 14:00 - pham vu

- Tập tin clipboard-202312071400-omeld.png được thêm

Kết quả: đã gửi thiết bị và cáp quang ra HN , đợi server chuyển ra bớt ở rack C14 sẽ lắp.
sơ đồ dự tính đầu nối:

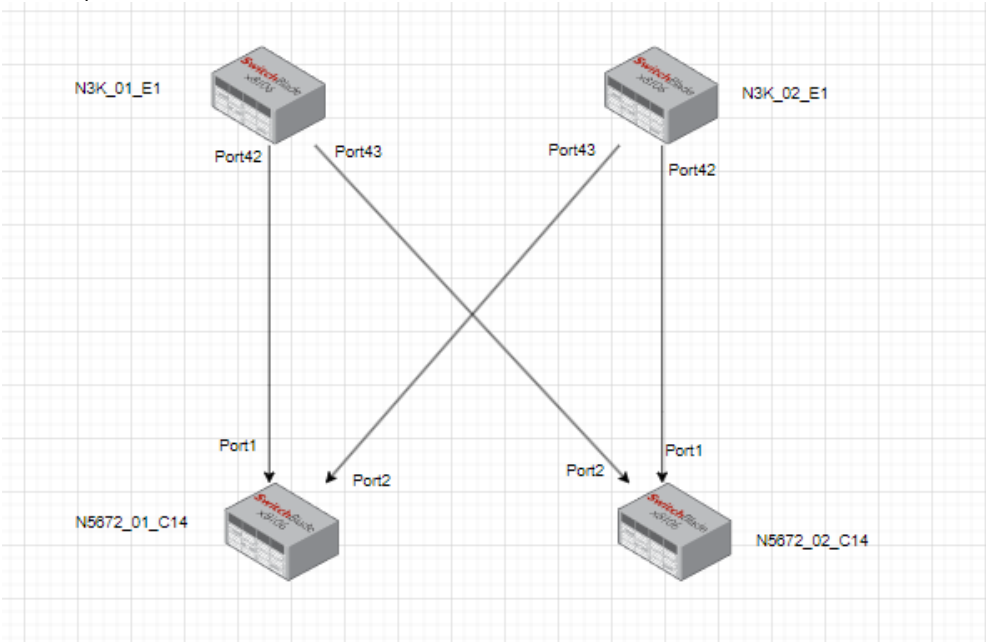

đang đợi thương lượng với bên FPT,họ chưa duyệt phần nguồn của sw do quá tải cần rút bớt thiết bị cân đối lại nguồn điện.
quy trình lắp N5K: <https://docs.google.com/document/d/1-d8aAnXb738fA43beFdMY6hxaGjxLaHs/edit>

#3 - 07-12-2023 14:00 - pham vu

- Trạng thái thay đổi từ New tới In Progress

#4 - 12-12-2023 08:53 - pham vu

- Tiến độ thay đổi từ 30 tới 100

#5 - 12-12-2023 08:54 - pham vu

Kết quả: đã triển khai xong Cặp N5K mới.

#6 - 12-12-2023 08:56 - pham vu

- Trạng thái thay đổi từ In Progress tới Closed

Tập tin

clipboard-202312071400-omeld.png	41,5 KB	07-12-2023	pham vu
----------------------------------	---------	------------	---------
