

LV Network - Task #844

VNPT HN triển khai đấu nối layer 2 và layer3 giữa cụm cũ và cụm mới.

10-06-2024 06:50 - pham vu


Trạng thái:	Closed	Bắt đầu:	10-06-2024
Mức ưu tiên:	Normal	Hết hạn:	14-06-2024
Phân công cho:	pham vu	Tiến độ:	100%
Chủ đề:		Thời gian ước lượng:	0:00 giờ
Phiên bản:		Thời gian:	0:00 giờ
Mô tả mục tiêu: kết nối 2 cụm mới triển khai ở VNPT HN với cụm cũ để move dịch vụ qua. chuẩn bị: cáp nối giữa các rack, SFP.... các bước thực hiện : + cắm layer2 giữa N5K T3.06 và N9K T4.10, sau đó thả 1 vlan test. + nối layer3 giữa SW HP T3.9 Core và N9K T4.10 , set ip ping test.			

Lược sử

#1 - 12-06-2024 08:11 - pham vu

- Tập tin clipboard-202406120811-spjbl.png được thêm
- Tiến độ thay đổi từ 0 tới 100

- đã nối xong 2 link , test kết nối ổn:

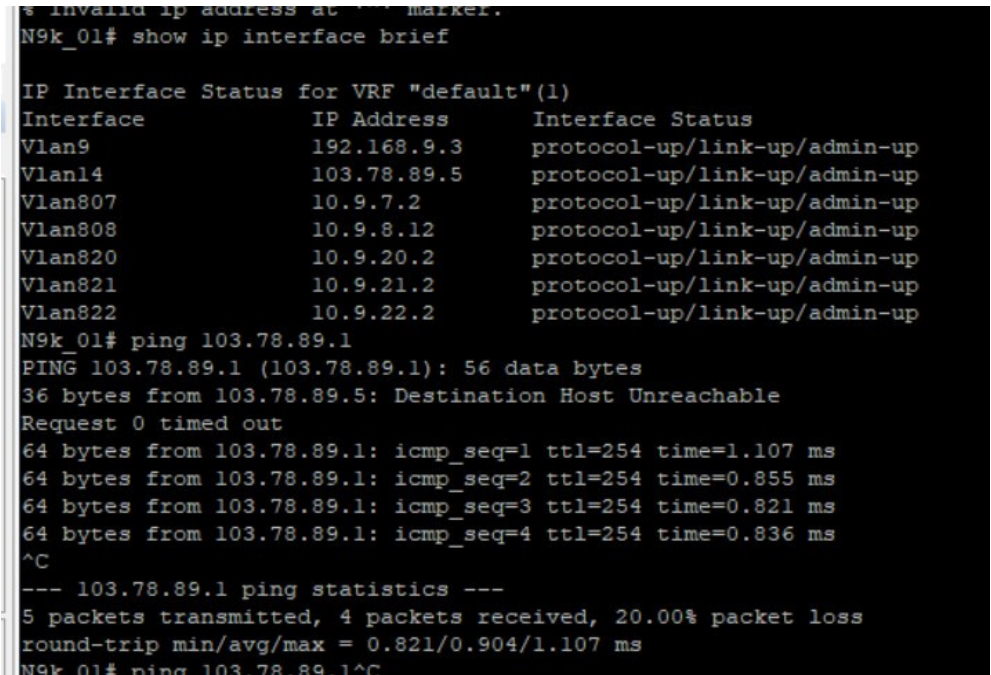

#2 - 12-06-2024 10:31 - pham vu

- Tập tin clipboard-202406121031-rsvgx.png được thêm

Test N5K và N9K:

```
LongVanIDC-N5K01(config-if)# end
LongVanIDC-N5K01# show ip interface brief
IP Interface Status for VRF "default"(1)
Interface          IP Address          Interface Status
Vlan1              172.18.1.2          protocol-up/link-up/admin-up
Vlan10             10.0.0.250          protocol-up/link-up/admin-up
Vlan1341           172.18.18.1         protocol-up/link-up/admin-up
LongVanIDC-N5K01# ping 172.18.1.1
PING 172.18.1.1 (172.18.1.1): 56 data bytes
Request 0 timed out
64 bytes from 172.18.1.1: icmp_seq=1 ttl=254 time=1.585 ms
64 bytes from 172.18.1.1: icmp_seq=2 ttl=254 time=1.525 ms
64 bytes from 172.18.1.1: icmp_seq=3 ttl=254 time=1.44 ms
64 bytes from 172.18.1.1: icmp_seq=4 ttl=254 time=1.404 ms

--- 172.18.1.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 4 packets received, 20.00% packet loss
```

#3 - 17-06-2024 07:20 - pham vu
- Trạng thái thay đổi từ New tới Closed

Tập tin

clipboard-202406120811-spjbl.png	374 KB	12-06-2024	pham vu
clipboard-202406121031-rsvgx.png	39,5 KB	12-06-2024	pham vu
